Bureau Veritas Exploitation SAS
DIJON
6 rue Marcel Dassault
21000 DIJON France
Mail : florian.mathieu@bureauveritas.com

A l'attention de M. ROUSSIN Jessy
COMMUNE DE CLAMECY
PLACE DU 19 AOUT
58500 CLAMECY

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
https://bvlink.bureauveritas.com/

Rapport de vérification électricité visite périodique

Mairie

AVEC ECART

Intervention du 06/07/2026 (1.0 jour)

Coordonnées du site :
Nom du site : MAIRIE DE CLAMECY
Latitude : 47.46
Longitude : 3.5186

Lieu d'intervention :
PLACE DU 19 AOUT
58503 CLAMECY

Numéro d'affaire : 7884987
Référence du rapport : 7884987/16.5.1.P
Rédigé le : 09/07/2026
Par : Florian MATHIEU
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : Mairie et marché couvert

Date de la précédente vérification : 31/07/2025

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Sommaire

Préambule....3
Rappel des obligations de l'employeur....3
Actions à mener....3

Liste récapitulative des observations issues de la vérification....5
MAIRIE DE CLAMECY (PLACE DU 19 AOUT / 58503 CLAMECY)....5
MAIRIE DE CLAMECY (PLACE DU 19 AOUT / 58503 CLAMECY)....5

Informations générales....8
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client....8
Personne chargée de la surveillance de l'installation....8
Installations vérifiées....8
Eléments de l'installation non vérifiables....8
Modifications apportées aux installations....8

Vérification relative à la protection des travailleurs....9
Information documentaire....9
Textes de référence....9
Modalité de vérification....9
Registre de sécurité....10
Condition de mise hors tension....10

Résultats des mesures et essais....11
Conditions de mesure....11
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure....11
Appareils de mesure utilisés....11
Prises de terre....12
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT....12
Dispositifs différentiels non inclus dans une armoire ou un coffret....13

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension....15

Information complémentaire à l'attention du client....16

Copyright BUREAU VERITAS

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques basse tension (BT) et, le cas échéant, être présent lors des coupures haute tension (HT) que vous (employeur) organisez avec du personnel qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en HT.

L'objectif des coupures est d'effectuer les essais et mesures nécessaires pour vérifier la protection des personnes contre les risques électriques. Un manquement à vos obligations règlementaires sera signalé dans le rapport de vérification sous forme d'une observation conformément aux prescriptions du document Question/Réponse de la Direction Générale du Travail (DGT).

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence BT du type télécommandées,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- si nécessaire, l'isolement des circuits BT.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et indispensable pour la réalisation de la vérification, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

Les informations concernées sont :

- l'ensemble des documents du dossier technique définie dans l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011 et rappelé dans le chapitre « Information documentaire » du présent rapport ;
- pour la réalisation des vérifications périodiques annuelle, les rapports mentionnés ci-après.
    - Par ordre de priorité : le rapport de vérification initiale de l'installation ou un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » réalisé depuis moins de quatre ans ;
    - Le rapport périodique de l'année antérieure pour les installations existantes depuis plus d'un an.
- En l'absence des rapports antérieurs nécessaire pour la réalisation de la vérification périodique annuelle, la vérification périodique doit être conduite comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents, ...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport.
Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

Copyright BUREAU VERITAS

Préambule

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.
La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes / Critères			
✓ Sans observation ✓ 100 % des coupures basse tension réalisées	✓	✓	✗
✓ 100% des points vérifiés ✓ 100% des locaux vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | MAIRIE DE CLAMECY

MAIRIE DE CLAMECY (PLACE DU 19 AOUT / 58503 CLAMECY)

Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension

Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

MAIRIE DE CLAMECY (PLACE DU 19 AOUT / 58503 CLAMECY)

Installations Basse et Très Basse Tension

Mairie

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*
Evacuation (balisage)		
Eclairage de securite : caracteristiques	**1**	**Remettre en état de fonctionnement les éclairages de sécurité suivants :** **- 2ème étage : circulation bureaux** **- Les halles : un bloc de secours** **- Chaufferie**

Code Obs. : *FM/310823/091438/0*
Date de 1er signalement : *31/08/2023*
Art. Réf. : *CDT R.4226-13 Arrêté A.14/12/2011 art 11*

Vous pouvez souscrire à l'option Data View

Aucune image disponible

Mairie
↳ Sous-sol
↳ **Salle de traitement**

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*
Armoire sous sol		
Coffrets et armoires electriques	**2**	**Installer un dispositif de coupure générale armoire.**

Code Obs. : *MV/150222/141721/0*
Date de 1er signalement : *15/02/2022*
Art. Réf. : *CDT R.4215-8 NF C 15-100-1 Art.461 - 465 - 537 - Annexe 53A*

Armoire sous sol : differentiel 1		
Dispositifs bt	**3**	**Remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle de courant nominal 63A.**

Code Obs. : *FM/310724/102508/0*
Date de 1er signalement : *31/07/2024*
Art. Réf. : *CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.536.4.2.2 - 536.4.2.3 - 536.4.3*

Armoire sous sol : differentiel 2		
Dispositifs bt	**4**	**Remplacer l'interrupteur différentiel par un modèle de courant nominal 63A.**

Code Obs. : *FM/310724/102604/0*
Date de 1er signalement : *31/07/2024*
Art. Réf. : *CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.536.4.2.2 - 536.4.2.3 - 536.4.3*

Copyright BUREAU VERITAS

Liste récapitulative
des observations issues de la vérification

Point vérifié	N°	Observation(s)

Armoire sous sol : Non repéré

Dispositifs bt **5** **Identifier le départ**

Code Obs. : MV/150222/140647/0 | *Date de 1er signalement :* 15/02/2022 | *Art. Réf. :* CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514

Mairie

↳ 1er étage

↳ **Bureau accueil**

Point vérifié	N°	Observation(s)

Armoire accueil

Coffrets et armoires electriques **6** **Obturer le percement au dessus du coffret.**

Code Obs. : MV/150222/144236/0 | *Date de 1er signalement :* 15/02/2022 | *Art. Réf. :* CDT R.4215-11 NF C 15-100-1 Art.512.2

Armoire accueil : inter diff 1

Dispositifs bt **7** **Protéger contre les surcharges l'interrupteur en en plaçant un autre de calibre 63 A minimum.**

Code Obs. : MV/150222/144648/0 | *Date de 1er signalement :* 15/02/2022 | *Art. Réf. :* CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533

Armoire accueil : inter diff 2

Dispositifs bt **8** **Protéger contre les surcharges l'interrupteur en en plaçant un autre de calibre 63 A minimum.**

Code Obs. : MV/150222/144824/0 | *Date de 1er signalement :* 15/02/2022 | *Art. Réf. :* CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533

Armoire accueil : inter diff pc 1

Dispositifs bt **9** **Protéger contre les surcharges l'interrupteur en en plaçant un autre de calibre 63 A minimum.**

Code Obs. : MV/150222/144937/0 | *Date de 1er signalement :* 15/02/2022 | *Art. Réf. :* CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533

Armoire accueil : inter diff pc 1 D

Dispositifs bt **10** **Protéger contre les surcharges l'interrupteur en en plaçant un autre de calibre 63 A minimum.**

Code Obs. : MV/150222/145038/0 | *Date de 1er signalement :* 15/02/2022 | *Art. Réf. :* CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533

Armoire accueil : inter diff pc 2

Dispositifs bt **11** **Protéger contre les surcharges l'interrupteur en en plaçant un autre de calibre 63 A minimum.**

Code Obs. : MV/150222/145002/0 | *Date de 1er signalement :* 15/02/2022 | *Art. Réf. :* CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533

Armoire accueil : inter diff pc 2 D

Dispositifs bt **12** **Protéger contre les surcharges l'interrupteur en en plaçant un autre de calibre 63 A minimum.**

Code Obs. : MV/150222/145125/0 | *Date de 1er signalement :* 15/02/2022 | *Art. Réf. :* CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533

Liste récapitulative
des observations issues de la vérification

Mairie

↳ 2ème étage

↳ **Local électrique**

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*

Armoire 2ème étage

Coffrets et armoires electriques **13** **Compléter l'identification des départs ou installer un schéma d'installation.**

Code Obs. : *MV/150222/154150/0*
Date de 1er signalement : *15/02/2022*
Art. Réf. : *CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514*

Armoire 2ème étage : vieille armoire salle des fetes

Dispositifs bt **14** **Remplacer le dispositif de protection par un modèle assurant le pouvoir de coupure.**

Code Obs. : *DC/310725/114921/1*
Date de 1er signalement : *31/07/2025*
Art. Réf. : *CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533*

Les halles

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*

Coffret extérieur

Coffrets et armoires electriques **15** **Refixer le plastron général du coffret.**

Code Obs. : *FM/060726/104938/0*
Date de 1er signalement : *06/07/2026* NOUVEAU
Art. Réf. : *CDT R.4215-11 NF C 15-100-1 Art.522*

Coffret extérieur

Coffrets et armoires electriques **16** **Isoler les extrémités des conducteurs inutilisés sous le disjoncteur "Coffret forain 2".**

Code Obs. : *DC/310725/140433/0*
Date de 1er signalement : *31/07/2025*
Art. Réf. : *CDT R.4215-3 NF C 15-100-1 Art.4-41 - Annexe 41A.2*

Coffret extérieur : commande guirlande (hager)

Dispositifs bt **17** **Remplacer le dispositif de protection par un modèle assurant le pouvoir de coupure (minimum 12,7 kA, pas de filiation disjoncteur hager)**

Code Obs. : *MV/160222/195108/0*
Date de 1er signalement : *15/02/2022*
Art. Réf. : *CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533*

Tableautin DAE : DAE

Dispositifs bt **18** **Protéger la canalisation contre les surcharges.**

Code Obs. : *FM/070726/160101/0*
Date de 1er signalement : *06/07/2026* NOUVEAU
Art. Réf. : *CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533*

Armoires les halles : Non repéré

Dispositifs bt **19** **Compléter l'identification du départ.**

Code Obs. : *FM/060726/093717/0*
Date de 1er signalement : *06/07/2026* NOUVEAU
Art. Réf. : *CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514*

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intègrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement d'établir la pertinence de la solution proposée vis-à-vis des contraintes d'exploitation.

Copyright BUREAU VERITAS

Informations générales

Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 7884987/16.3.1.P
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Absent
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 7884987/16.4.1.R

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. ROUSSIN, RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Vérification partielle des installations électriques de l'établissement, conformément à la demande du client, notre vérification porte uniquement sur la mairie et les halles. Notre vérification ne concerne pas la salle des fêtes

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Origine de l'installation vérifiée : Partie aval de l'appareil général de commande et de protection (AGCP) d'un comptage à puissance limitée situé dans le local coffre

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Eléments de l'installation non vérifiables

MAIRIE DE CLAMECY>PLACE DU 19 AOUT > 58503 CLAMECY

Mairie > Rez-de-chaussée > Hall d'entrée

RÉCEPTEURS : ***Point lumineux***

Eclairage inaccessible : luminaire implanté à plus de 3m de haut et absence de moyens d'accès en sécurité ou luminaire placé derrière des éléments non démontables.

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.
En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
Dossier Technique		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Absent
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Absent
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Sans objet
3a - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Absent
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Absent
5 - Carnets de câbles		Absent
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Absent
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Présent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Absent
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence : BUREAU VERITAS	Présent

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les points 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

MAIRIE DE CLAMECY
Arrêtés :
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

Normes :
- NF C 15-100-1 : installation électrique à basse tension
- NF C 15-100-7-729 : locaux ou emplacements de service électrique

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. RAPINEAU, SERVICE TECHNIQUE, Electricien

Copyright BUREAU VERITAS

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. RAPINEAU, SERVICE TECHNIQUE, Electricien

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

Le client ou son représentant nous a autorisés à réaliser le démontage et le remontage des plastrons des armoires et coffrets.

L'ensemble des dispositifs de coupure d'urgence électrique de l'installation Basse Tension qui sont actionnés par télécommande ont été essayés lors de notre vérification.

Les dispositifs de coupure d'urgence objets de nos essais sont les dispositifs à action télécommandée prévus pour couper, en cas d'apparition d'un danger inattendu (chocs électriques, incendie ou explosion), l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits, de manière à satisfaire aux exigences réglementaires.

Les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas être confondus avec les dispositifs d'arrêt d'urgence prescrits par la réglementation pour certains équipements de travail (Fonctionnement d'urgence destiné à arrêter un processus ou un mouvement devenu dangereux).

Dans le cadre de nos vérifications réglementaires nous n'avons pas à essayer les dispositifs assurant la seule fonction d'arrêt d'urgence. Toutefois, un dispositif d'arrêt d'urgence peut être utilisé comme dispositif de coupure d'urgence s'il satisfait à toutes les conditions correspondant à cette fonction.

Copyright BUREAU VERITAS

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT
Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure ou égale à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION
Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS
La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 In et In. (In : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.
Les dispositifs différentiels résiduels dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, sont testés mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")
Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE
Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par excès.
- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100-1, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	**FF**	**EI**	**PT**	**IND**

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	**RB**	**T**

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	**A**	**B**	**C**

RECEPTEURS ELECTRIQUES :
PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)
AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Appareils de mesure utilisés

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Résultats des mesures et essais

Mesure de la résistance de prises de terre : **SEFRAM MW9655**
Mesure de l'isolement : **Sans objet**
Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **SEFRAM MW9655**
Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **SEFRAM MW9655**
Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**
Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
MAIRIE DE CLAMECY(PLACE DU 19 AOUT / 58503 CLAMECY)						
Mairie > Rez-de-chaussée > Local électrique						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	PT	RB	12	B		

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
MAIRIE DE CLAMECY(PLACE DU 19 AOUT / 58503 CLAMECY)					
Les halles					
Armoires les halles					
Iner diff coffret pc 123	*30*		1		
Inter diff coffret pc 456	*30*		1		
Iner diff coffret pc 789	*30*		1		
CE _1	*30*		1		
CE _2	*30*		1		
CE _3	*30*		1		
CE _4	*30*		1		
CE _5	*30*		1		
CE _6	*30*		1		
Inter diff rampe éclairage A	*300*		1		
Inter diff rampe éclairage C	*300*		1		
Coffret extérieur					
fontaine	*30*		1		
collegiale	*30*		1		
Coffret forain 1	*300*		1		
Coffret forain 2	*300*		1		
guirlande 1	*30*		1		
guirlande 2	*30*		1		
commande guirlande (hager)	*30*		1		**17**
Tableautin DAE					
Général	*30*		1		
DAE	*30*		1		**18**
Mairie > 1er étage > Bureau accueil					
Armoire accueil					
inter diff 1	*30*		1		**7**

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
inter diff 2	*30*		1		**8**
inter diff pc 1	*30*		1		**9**
inter diff pc 2	*30*		1		**11**
inter diff pc 1 D	*30*		1		**10**
inter diff pc 2 D	*30*		1		**12**
Mairie > 2ème étage > Local électrique					
Armoire 2ème étage					
Sirène	*300*		1		
Inter diff pc	*30*		1		
Inter diff pc détrompées	*30*		1		
Non repéré	*30*		1		
lum bureaux 1 2 3	*30*		1		
lum deg ascenceur	*30*		1		
lum 1/3	*30*		1		
lum palier 1er étage	*30*		1		
lum bureau 4	*30*		1		
lum bureau 2	*30*		1		
lum bureau 5	*30*		1		
libre	*30*		1		
lum escalier	*30*		1		
horloge	*30*		1		
lum archive	*30*		1		
chaufferie	*300*		1		
Ascenceur	*300*		1		
prise baie info 1	*30*		1		
prise baie info 2	*30*		1		
Inter diff circuit spécialisé	*30*		1		
Mairie > Rez-de-chaussée > Local électrique					
COMPTAGE					
Disjoncteur de branchement	*3000 **	*150*	1		
Armoire Rez de chaussée					
Inter dif pc lum	*30*		1		
Mairie > Sous-sol > Salle de traitement					
Armoire sous sol					
differentiel 1	*30*		1		**3**
differentiel 2	*30*		1		**4**

(1) *La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.*
La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé
*« * » Indique que le dispositif différentiel résiduel correspondant, dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, a été testé mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.*

Dispositifs différentiels non inclus dans une armoire ou un coffret

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	tempo (ms)	Fonct (1)		
MAIRIE DE CLAMECY(PLACE DU 19 AOUT / 58503 CLAMECY)					
Mairie > 1er étage > Salle Romain Rolland					
Coffret électrique	*30*		*1*		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Résultats des mesures et essais

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	tempo (ms)	Fonct (1)		
Extérieur > Coffret prises de courant 1					
Prise de courant triphasée	*30*		*1*		
Prise de courant monophasée	*30*		*1*		
Extérieur > Coffret prises de courant 5					
Prise de courant monophasée	*30*		*1*		
Prise de courant triphasée	*30*		*1*		
Extérieur > Coffret prises de courant 2					
Prise de courant triphasée	*30*		*1*		
Prise de courant monophasée	*30*		*1*		
Extérieur > Coffret prises de courant 3					
Prise de courant triphasée	*30*		*1*		
Prise de courant monophasée	*30*		*1*		
Extérieur > Coffret prises de courant 4					
Prise de courant triphasée	*30*		*1*		
Prise de courant monophasée	*30*		*1*		


(1)*La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.*
La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

MAIRIE DE CLAMECY

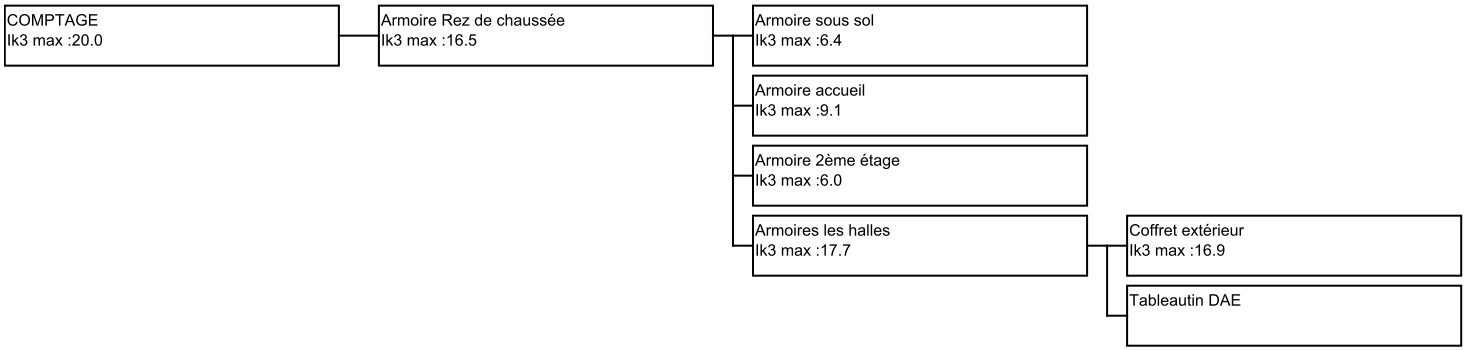

Copyright BUREAU VERITAS

Information complémentaire à l'attention du client

MAIRIE DE CLAMECY

PLACE DU 19 AOUT > 58503 CLAMECY

Local :	**Les halles**
	Pénétration de câble sur l'alimentation prise blanche banc poissonnier Alimentation banc boucher via le rajout d'une fiche multiple
Mairie > Sous-sol > Salle de traitement	
Armoire :	**Armoire sous sol**
	courant de court circuit estimé par nos soins longueur de câble 15 m section 10 mm2 cuivre donne Ik3 =6,4 kA et Ik1= 3,5 kA protection amont C32
Mairie > Rez-de-chaussée > Local électrique	
Armoire :	**Armoire Rez de chaussée**
	courant de court circuit estimé par nos soins longueur de câble 8m section 35mm2 donne Ik3 =16,5 kA et Ik1=12,1 kA
Mairie > 2ème étage > Local électrique	
Armoire :	**Armoire 2ème étage**
	courant de court circuit estimé par nos soins longueur de câble 25 m section 16 mm2 cuivre donne Ik3 =6,2 kA et Ik1= 3,4 kA
Mairie > 1er étage > Bureau accueil	
Armoire :	**Armoire accueil**
	courant de court circuit estimé par nos soins longueur de câble 20 m section 25 mm2 cuivre donne Ik3 = 9,1 kA et Ik1= 5,3 kA Protection amont C63
Les halles	
Armoire :	**Coffret extérieur**
	courant de court circuit estimé par nos soins longueur de câble 2 m section 35 mm2 cuivre donne Ik3 =16.9 kA et Ik1=12.7 kA
Les halles	
Armoire :	**Armoires les halles**
	courant de court circuit estimé par nos soins longueur de câble 5 m section 35 mm2 cuivre donne Ik3 =17.7 kA et Ik1=13.8 kA

Copyright BUREAU VERITAS
